


PROGRAM CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI SI DRUMURI EXPRES

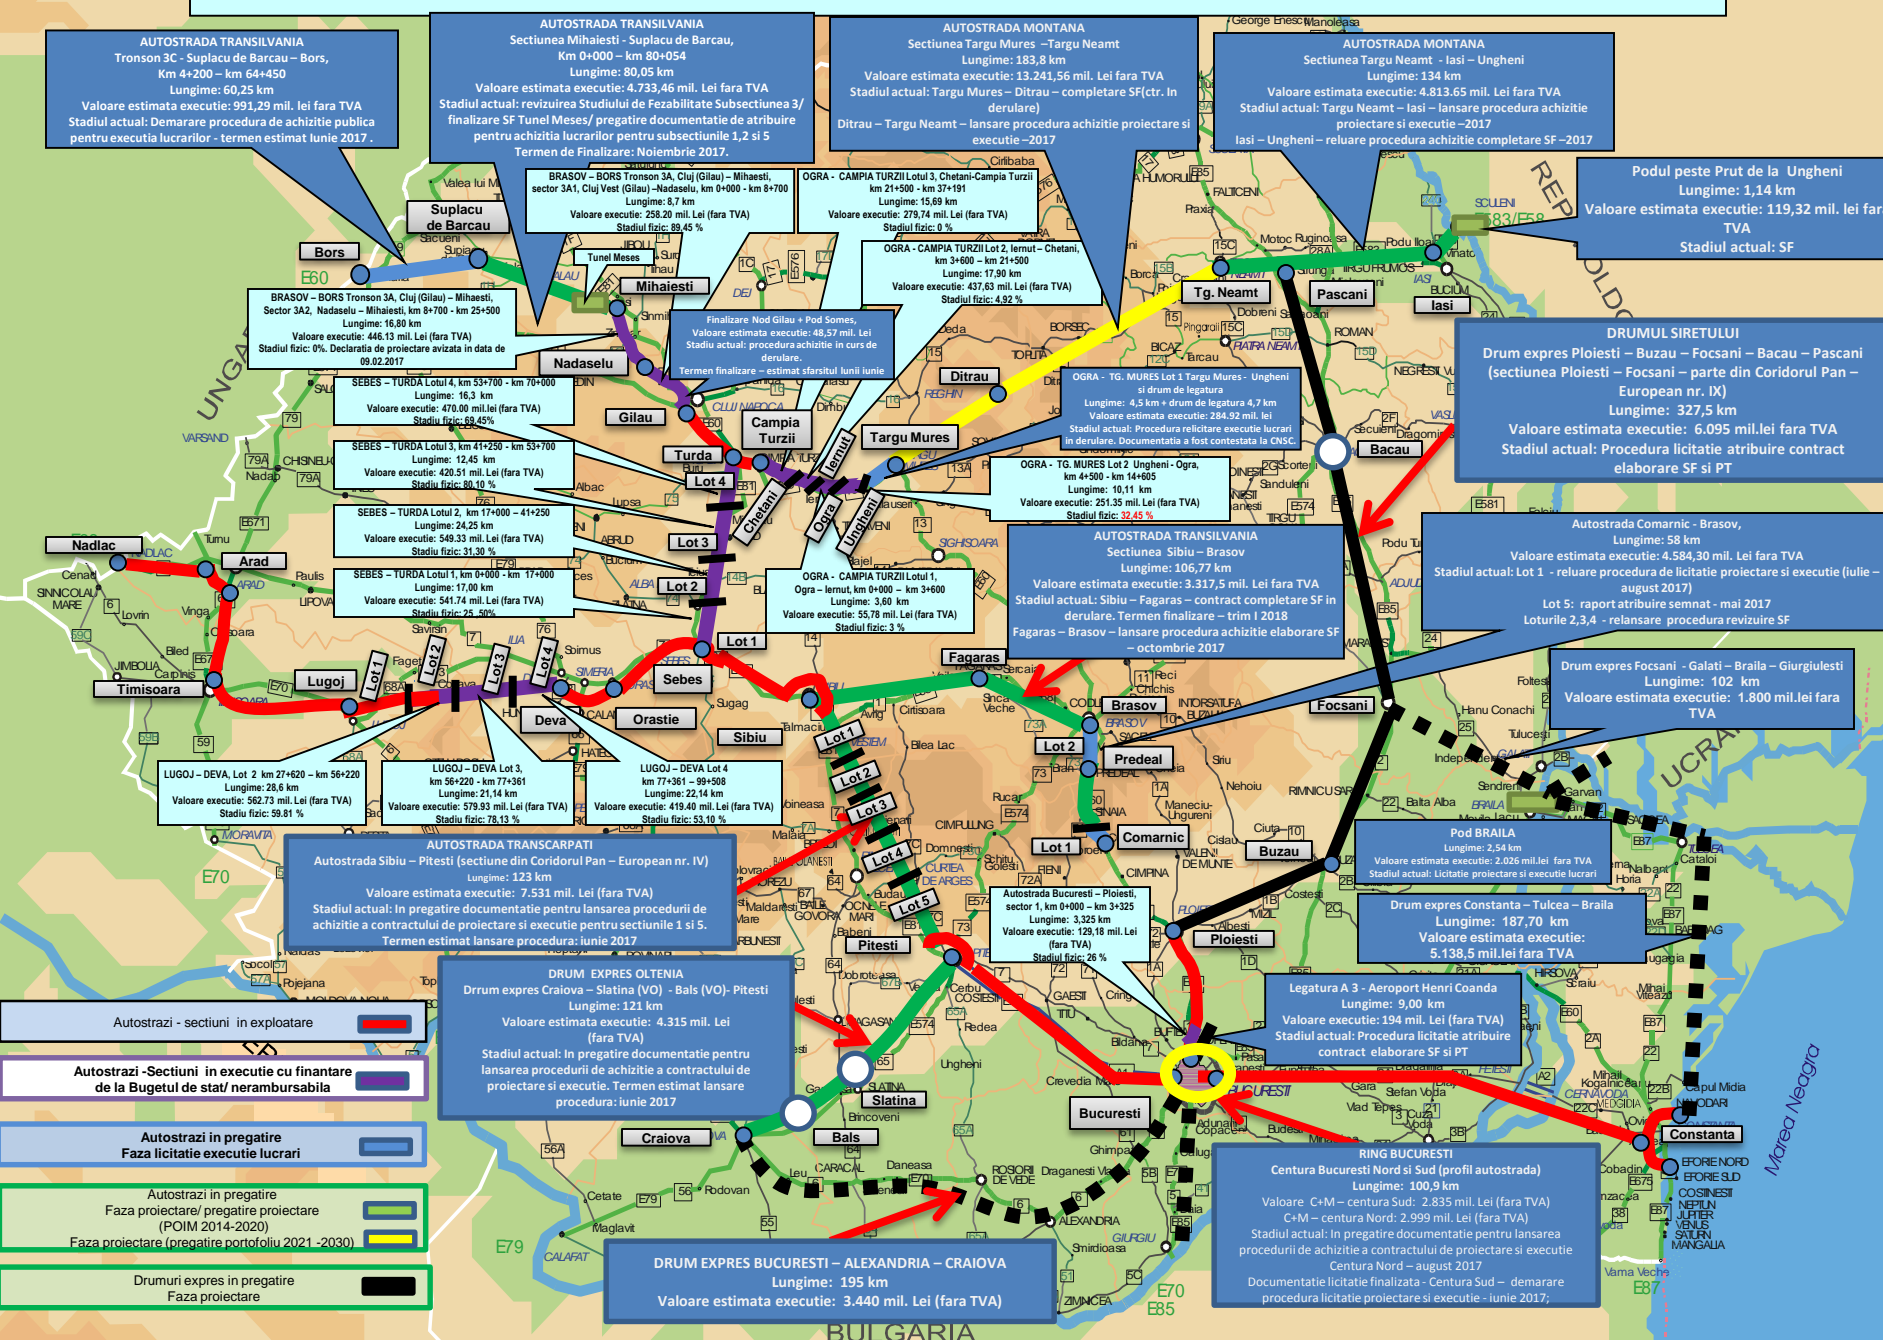

AUTOSTRADA TRANSILVANIA
Tronson 3C - Suplacu de Barcău – Bors,
Km 4+200 – km 68+450
Lungime: 60,25 km
Valoare estimata executie: 991,29 mil. lei fara TVA
Stadiul actual: Demararea procedura de achizitie publica pentru executia lucrarilor - termen estimat Iunie 2017 .

AUTOSTRADA TRANSILVANIA
Sectiunea Mihailesti - Suplacu de Barcău,
Km 0+000 – km 80+054
Lungime: 80,05 km
Valoare estimata executie: 4.793,46 mil. Lei fara TVA
Stadiul actual: revizuirea Studiului de Fezabilitate Subsectiunea 3/ finalizarea SF Tunel Meses/ pregatire documentatie de atribuire pentru achizitia lucrarilor pentru subsectiunile 1,2 si 5
Termen de Finalizare: Noiembrie 2017.

AUTOSTRADA MONTANA
Sectiunea Targu Mures –Targu Neamt
Lungime: 183,8 km
Valoare estimata executie: 13.241,56 mil. Lei fara TVA
Stadiul actual: Targu Mures –Ditrau – completare SF(ctr. In derulare)
Ditrau – Targu Neamt – lansare procedura achizitie proiectare si executie –2017

AUTOSTRADA MONTANA
Sectiunea Targu Neamt – Iasi – Ungheni
Lungime: 134 km
Valoare estimata executie: 4.813,65 mil. lei fara TVA
Stadiul actual: Targu Neamt – Iasi – lansare procedura achizitie proiectare si executie –2017
Iasi – Ungheni – reluare procedura achizitie complete SF –2017

Podul peste Prut de la Ungheni
Lungime: 1,14 km
Valoare estimata executie: 119,32 mil. lei fara TVA
Stadiul actual: SF

BRASOV – BORS Tronson 3A, Cluj (Giau) – Mihailesti, Sector 3A2, Nadaselu – Mihailesti, km 8+700 – km 25+500
Lungime: 16,80 km
Valoare executie: 446.13 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul fizic: 0%. Declaratia de proiectare avizata in data de 09.02.2017

BRASOV – BORS Tronson 3A, Cluj (Giau) – Mihailesti, sector 3A1, Ciuj Vest (Giau) –Nadaselu, km 0+000 – km 8+700
Lungime: 8,7 km
Valoare executie: 258,20 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul fizic: 89,45 %

OGRA - CAMPIA TURZII Lot1 3, Chetani-Campia Turzii km 21+500 – km 37+191
Lungime: 15,89 km
Valoare executie: 279,74 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul fizic: 0 %

OGRA - CAMPIA TURZII Lot 2, Iermut – Chetani, km 34+600 – km 21+500
Lungime: 13,10 km
Valoare executie: 437,63 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul fizic: 4,92 %

OGRA - TG. MURES Lot 1 Targu Mures- Ungheni si drum de legatura
Lungime: 4,5 km + drum de legatura 4,7 km
Valoare estimata executie: 284,92 mil. lei
Stadiul actual: Procedura licitatie executie lucrari in derulare. Documentatia a fost contestata la CANS

OGRA - TG. MURES Lot 2 Ungheni-Ogra, km 4+900 – km 14+605
Lungime: 10,11 km
Valoare executie: 251,35 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul fizic: 32,45 %

AUTOSTRADA TRANSILVANIA
Sectiunea Sibiu – Brasov
Lungime: 106,77 km
Valoare estimata executie: 3.317,5 mil. Lei fara TVA
Stadiul actual: Sibiu – Fagaras – contract completare SF in derulare. Termen finalizare – trim I 2018
Fagaras – Brasov – lansare procedura achizitie elaborare SF – octombrie 2017

DRUMUL SIRETULUI
Drum expres Ploiesti – Buzau – Focsani – Bacau – Pascani (sectiunea Ploiesti – Focsani – parte din Coridorul Pan – European nr. IX)
Lungime: 327,5 km
Valoare estimata executie: 6.095 mil.lei fara TVA
Stadiul actual: Procedura licitatie atribuire contract elaborare SF si PT

Autostrada Comarnic - Brasov,
Lungime: 58 km
Valoare estimata executie: 4.584,30 mil. Lei fara TVA
Stadiul actual: Lot 1 - reluare procedura de licitatie proiectare si executie (iulie – august 2017)
Lot 5 : raport atribuire semnat - mai 2017
Loturile 2,3,4 - relansare procedura revizuire SF

Drum expres Focsani - Galati – Braila – Giurgulesti
Lungime: 102 km
Valoare estimata executie: 1.800 mil.lei fara TVA

SEBES – TURDA Lot4, km 53+700 – km 70+000
Lungime: 16,3 km
Valoare executie: 478,00 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul fizic: 68,45 %

SEBES – TURDA Lot3, km 41+250 – km 53+700
Lungime: 12,45 km
Valoare executie: 420,51 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul fizic: 80,10 %

SEBES – TURDA Lot2, km 17+000 – 41+250
Lungime: 24,25 km
Valoare executie: 949,33 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul fizic: 31,30 %

SEBES – TURDA Lot1, km 0+000 – km 17+000
Lungime: 17,00 km
Valoare executie: 541,74 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul fizic: 25,50 %

LUGOJ – DEVA Lot 2 km 27+620 – km 56+220
Lungime: 28,6 km
Valoare executie: 562,73 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul fizic: 59,81 %

LUGOJ – DEVA Lot 3, km 56+220 – km 77+361
Lungime: 21,14 km
Valoare executie: 579,93 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul fizic: 78,13 %

LUGOJ – DEVA Lot 4, km 77+361 – 99+508
Lungime: 22,14 km
Valoare executie: 419,40 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul fizic: 53,10 %

AUTOSTRADA TRANSCARPATI
Autostrada Sibiu – Pitesti (sectiune din Coridorul Pan – European nr. IV)
Lungime: 123 km
Valoare estimata executie: 7.531 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul actual: In pregatire documentatie pentru lansarea procedurii de achizitie a contractului de proiectare si executie pentru sectiunile 1 si 5.
Termen estimat lansare procedura: Iunie 2017

DRUM EXPRES OLTENIA
Drum expres Craiova – Slatina (VO) - Bals (VO)- Pitesti
Lungime: 121 km
Valoare estimata executie: 4.315 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul actual: In pregatire documentatie pentru lansarea procedurii de achizitie a contractului de proiectare si executie. Termen estimat lansare procedura: Iunie 2017

Autostrada Bucuresti – Ploiesti, sector 4, km 0+000 – km 3+325
Lungime: 3,325 km
Valoare executie: 129,18 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul fizic: 26 %

Legatura A 3 - Aeroport Henri Coanda
Lungime: 9,00 km
Valoare executie: 194 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul actual: Procedura licitatie atribuire contract elaborare SF si PT

Pod BRAILA
Lungime: 2,54 km
Valoare estimata executie: 2.026 mil. lei fara TVA
Stadiul actual: Licitatie proiectare si executie lucrari

Drum expres Constanta – Tulcea – Braila
Lungime: 187,70 km
Valoare estimata executie: 5.138,5 mil. lei fara TVA

RING BUCURESTI
Centura Bucuresti Nord si Sud (profil autostrada)
Lungime: 100,9 km
Valoare C+M – centura Sud: 2.835 mil. Lei (fara TVA)
C+M – centura Nord: 2.999 mil. Lei (fara TVA)
Stadiul actual: In pregatire documentatie pentru lansarea procedurii de achizitie a contractului de proiectare si executie
Centura Nord – august 2017
Documentatie licitatie finalizata - Centura Sud – demarare procedura licitatie proiectare si executie - Iunie 2017;

DRUM EXPRES BUCURESTI – ALEXANDRIA – CRAIOVA
Lungime: 195 km
Valoare estimata executie: 3.440 mil. Lei (fara TVA)

- Autostrazi - sectiuni in exploatare
- Autostrazi -Sectiuni in executie cu finantare de la Bugetul de stat/ nerambursabila
- Autostrazi in pregatire
Faza licitatie executie lucrari
- Autostrazi in pregatire
Faza proiectare/ pregatire proiectare (POIM 2014-2020)
- Faza proiectare (pregatire portofoliu 2021 -2030)
- Drumuri expres in pregatire
Faza proiectare

VALOAREA PROCEDURILOR
LANSATE IN PERIOADA IAN.

– DEC. 2016:


851,048,674.96 lei (18%)

VALOAREA PROCEDURILOR
LANSATE IN PERIOADA IAN. -

IUNIE 2017:

3,441,421,791.75 lei

(82%)



20%

80%

■ 1

■ 2

In concluzie, in cele 4 luni aferente perioadei **ianuarie – iunie 2017**, au fost lansate proceduri de achizitie proiectare si executie lucrari cu o valoare de

3,441,421,791.75 lei

PROCEDURI DE ACHIZITIE LANSATE IAN – APRILIE (TRIM I) 2017

<u>Denumire proiect</u>	<u>Valoare lei, fara TVA</u>
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Focsani - Bacau	36,162,607.82
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Bacau - Pascani	27,667,305.62
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Buzau - Focsani	24,468,250.57
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Ploiesti - Buzau	23,032,579.36
Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum Expres Legatura A3 - Aeroport Henri Coanda	3,206,848.16
<u>VALOAREA TOTALA</u>	<u>114,537,591.53</u>

- Scenariul optimist: evaluarea ofertelor – septembrie 2017, semnare contract: trim IV 2017
- Scenariul pesimist: evaluarea ofertelor – trim. IV 2017, semnare contract: trim. I 2018

PROCEDURI DE ACHIZITIE LANSATE IN APRILIE - IUNIE 2017

<u>DENUMIRE</u>	<u>Valoare (Lei fara TVA)</u>
Proiectare si executie "Pod suspendat peste Dunare in zona Braila"	2,025,494,965.00
Proiectare si executie "Varianta de ocolire Timisoara Sud"	381,817,899.00
Executie lucrari - Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2 – A2: sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)	339,009,410.99
Executie lucrari - Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova, Lot 2: km 132+435 - km 185+230 - relicitare	267,153,697.92
Amenajare nod rutier CB – DN 4 (Oltenita) km 29+500 – 33+190	216,000,000
Amenajare nod rutier CB – DN 4 (Berceni) km 33+190 – 35+600	179,000,000
Proiectare si executie Pasaj Mogosoaia pe Centura Bucuresti peste DN 1A	32,945,818.84
<u>VALOAREA TOTALA 2017</u>	3,441,421,791.75

Pentru proiectele de constructie a Variantei de Ocolire Timisoara Sud, Centura Bucuresti si Reabilitare DN 6 - Licitatia pentru atribuirea contractelor de proiectare si executie in derulare. Termenul de depunere a ofertelor este luna iunie 2017 (daca nu sunt solicitate clarificari care sa se reflecte in modificarea documentatiei de atribuire si daca nu sunt depuse contestatii cu privire la documentatie). In scenariul in care nu se vor solicita clarificari cu privire la documentatie si data deschiderii se va mentine, data estimata pentru finalizarea **evaluarii ofertelor si desemnarea unui castigator este septembrie 2017.**

**PROCEDURI DE ACHIZITIE LANSATE IN MAI 2017 – TRANSMISE LA ANAP
PENTRU VALIDARE**

<u>DENUMIRE</u>	<u>Valoare</u> <u>(Lei fara TVA) – estimare conform</u> <u>Deviz</u>
Proiectare si executie Pasaj Mogosoia pe Centura Bucuresti peste DN 1A	32,945,818.84
Proiectare si executie DN 57, Nicolint – Oravita, km 137+500 – km 152+990	31,935,947
Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad - CF Curtici - DJ 709B, jud Arad	28,312,653.22
<u>VALOAREA TOTALA 2017</u>	<u>93,194,419.06</u>

**PROCEDURI DE ACHIZITIE LANSATE/ CE URMEAZA A FI LANSATE IN IUNIE -
AUGUST 2017**

<u>DENUMIRE</u>	<u>Valoare (Lei fara TVA) – estimare conform Deviz</u>	TERMEN LANSARE PROCEDURA
Proiectare si executie Autostrada de Centura Bucuresti Sud	2,834,976,000	Iunie 2017 – transmisa la ANAP spre validare
Proiectare si executie Autostrada de Centura Bucuresti Nord	2,999,688,000	August 2017
Proiectare si executie Drum Expres Craiova - Pitesti	4,314,517,000	Iunie 2017 – documentatie transmisa la ANAP spre validare (tronson 1 si tronson 2)
Proiectare si executie Autostrada Sibiu – Pitesti, sectiunile 1 si 5	2,480,609,304.62	Iunie 2017
<u>VALOAREA TOTALA 2017</u>	<u>12,629,790,304.62</u>	

PROMOVAREA PROIECTULUI “AUTOSTRADA COMARNIC – BRASOV”
PROCEDURI DE ACHIZITIE CE URMEAZA A FI LANSATE IN IULIE - AUGUST 2017

<u>DENUMIRE</u>	<u>Valoare (Lei fara TVA)</u>	<u>Lansare procedura/ semnare contract</u>
Lot 1: sector zona Comarnic (km 111+300- km 115+300)	166,855,909	Reluare procedura de licitatie proiectare si executie Iulie – august 2017
Lot 5: Sector Rasnov - Cristian si Drum de Legatura cu DN 73 cu o lungime de 6,3 km (autostrada) si 3,7 km (drum national la 4 benzi)	149,837,204	Semnare raport de atribuire - Mai 2017
<u>VALOAREA TOTALA 2017</u>	<u>316,693,113</u>	

<u>DENUMIRE</u>	<u>Strategie de contractare</u>	<u>TERMEN SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE</u>
<u>Loturile 2,3,4: Sectorul Comarnic-Predeal (km 115+300 - km 146+800) si sector Predeal-Cristian, (km 146+800 - km 162+300) + reabilitare DN 73B</u>	Relansare procedura revizuire Studiu de Fezabilitate	Iulie – august 2017

Pentru obiectivele **proiectare si executie Varianta de ocolire Comarnic si Varianta de ocolire Busteni** , au fost lansate procedurile de licitatie, estimandu-se finalizarea procedurii de achizitie in luna mai 2017.

PROMOVAREA PROIECTULUI “AUTOSTRADA MONTANA” Targu Mures – Ditrau – Targu Neamt - Ungheni

<u>DENUMIRE</u>	<u>Strategie de implementare</u>	<u>TERMEN FINALIZARE</u>
Targu Mures - Ditrau	Completarea Studiului de Fezabilitate – reluarea contractului de proiectare	Mai – iunie 2017
Ditrau – Targu Neamt	Lansare procedura achizitie “proiectare si executie” Valoare estimata: <u>17,126,120,315 lei</u>	Decembrie 2017
Targu Neamt – Iasi	Lansare procedura achizitie “proiectare si executie”	Decembrie 2017
Iasi - Ungheni	Reluare procedura de achizitie completare Studiu de Fezabilitate	Septembrie 2017

PROMOVAREA PROIECTULUI “AUTOSTRADA SIBIU – BRASOV”

<u>DENUMIRE</u>	<u>Strategie de implementare</u>	TERMEN FINALIZARE
Sibiu - Fagaras	Completarea Studiului de Fezabilitate – contract in derulare	Trim. I 2018.
Fagaras - Brasov	Lansare procedura achizitie elaborare Studiu de Fezabilitate	Septembrie 2017

Promovarea proiectelor in cadrul actualei perioade de programare se va face conditionat, in functie de:

- Justificarea interventiei prin rezultatele Master Planului General de Transport;
- Existenta/ promovarea unei documentatii de inalta calitate, pentru a se asigura un management contractual in favoarea beneficiarului.
